

2021 年 6 月 10 日

各 位

日本軽金属株式会社

雨畑地区土砂対策第 3 回フォローアップ検討会の実施について

日本軽金属株式会社（本社：東京都港区、社長：岡本 一郎）は 6 月 4 日に雨畑地区土砂対策第 3 回フォローアップ検討会を国土交通省、山梨県、早川町と実施いたしましたので、お知らせします。

弊社が保有する雨畑ダム（山梨県南巨摩郡早川町）について、2019 年 8 月 9 日付で国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所より、雨畑ダムの定期検査結果に関する行政指導を受けました。また、2019 年 8 月の台風 10 号・同年 10 月の台風 19 号などによる豪雨の影響を受け雨畑ダム上流の雨畑川の水位が上昇したことにより周辺地域で浸水被害が発生しました。

弊社は 2019 年 9 月に国土交通省、山梨県、早川町とともに雨畑地区土砂対策検討会を設立し、周辺地域における浸水被害発生に対する応急対策、及び堆積土砂の抜本対策について検討を重ねたうえで取り纏めました雨畑ダム堆砂対策基本計画書を 2020 年 4 月 30 日に提出いたしました。

今回の第 3 回フォローアップ検討会では、2020 年 11 月 26 日に実施した第 2 回に引き続き、基本計画に基づくこれまでの対策の進捗状況を報告いたしました。

弊社は、今後も地域の安全確保を最優先とし、雨畑ダム堆砂対策基本計画書に基づき、関係する皆様のご協力もいただきながら、計画を着実に実行してまいります。

（添付資料 計 3 枚）

本件に関するお問い合わせ：

日本軽金属株式会社 蒲原製造所総務課 TEL：054-385-2111

日本軽金属株式会社 広報室 TEL：03-6810-7160

以上

## 1. フォローアップ検討会について



NIPPON LIGHT METAL COMPANY, LTD.

### ➤これまでの雨畑ダム堆砂対策に係る検討会の経緯

- 過去からのダム定期検査の指摘に加え、台風被災を契機に行政より指導を受け、2度と浸水被害が起こらないように雨畑地区土砂対策検討会を設立し、4回に亘る関係機関との協議を実施。合意内容を基に雨畑ダム堆砂対策基本計画を策定(2020年4月30日)し、堆砂対策を開始。
- その内容の進捗についてフォローアップ検討会を第1回2020年6月11日、第2回同年11月26日に開催した。

### ➤第2回までの主な指摘事項

- 堆砂対策については洪水が安全に流下可能な河道を確保すると共に掘削計画を作成し、環境に配慮しながら継続的にすすめること。
- 持続可能な対応について、幅広い視点で検討する必要がある。
- 土砂搬出については、搬出ルート確保と安全な運行につとめること。
- 骨材や造成などの搬出先の確保につとめること。

実施状況を適切に把握し、改善点などに対応すべく、  
第3回フォローアップ検討会を2021年6月4日に開催した。

1

## 2. ロードマップ進捗



NIPPON LIGHT METAL COMPANY, LTD.

雨畑地区土砂対策基本計画 ロードマップ

| 項目    | 細目           | 課題                               | 協議・調査                                              |        | 短期        |        |        | 中期        |  | 長期 |  |
|-------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--|----|--|
|       |              |                                  | 2020年度                                             | 2021年度 | 2022年度    | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度～   |  |    |  |
| 緊急対策  | 仮設堤防の建設      | —                                | 工事完了                                               |        |           |        |        |           |  |    |  |
|       | 河道の確保        | —                                | 河道は2020年度の出水期までに確保し、維持している。<br>今後も河道を掘削し、災害防止に努める。 |        |           |        |        |           |  |    |  |
|       | 保護盛土等に湖内一時活用 | —                                | 湖内移動 60万㎡完了                                        |        |           |        |        |           |  |    |  |
| 抜本的対策 | 搬出能力の増強      | —                                | 2020年度は120万㎡/年体制確保。2021年度より150万㎡/年体制を確立            |        |           |        |        |           |  |    |  |
|       | 骨材資源         | 需要のさらなる拡大に対応                     | 需要低調、回復すべく拡販調整中                                    |        |           |        |        |           |  |    |  |
|       | 土砂の活用        | 雨畑川運搬路                           | 県道被災時の一般車の利用を踏まえた構造                                | 工事継続中  |           |        |        |           |  |    |  |
|       | 早川運搬路        | 狭窄部や河川横断構造物付近の迂回                 | 概略設計完了し着工                                          |        |           |        |        |           |  |    |  |
|       | 処分地の確保       | 地域の要望に加えて、広域的なニーズの調査<br>仮置ヤードの確保 | 一部確定し着工                                            |        |           |        |        |           |  |    |  |
|       | 継続的堆砂対策      | 安全な堆砂状態を継続的に維持するための幅広い視点での方策の検討  | 継続して検討中                                            |        |           |        |        |           |  |    |  |
|       | 由砂の移動・搬出量    | 2020年度実績 165万㎡                   | 150万㎡                                              | 150万㎡  | 100万㎡～    | 100万㎡～ | 100万㎡～ | 流入量に応じた対策 |  |    |  |
|       |              |                                  | 300万㎡                                              |        | 300～400万㎡ |        |        |           |  |    |  |

2

### 3.-1 仮設堤防建設および河道確保 仮設堤防建設



NIPPON LIGHT METAL COMPANY, LTD.



施工期間：2020年2月～11月末  
・堤防天端は町道として2020年  
12月1日より運用開始




3

### 3.-2 河道の確保



NIPPON LIGHT METAL COMPANY, LTD.

河道掘削による水位低下と仮設堤防で、本村地区の安全を確保

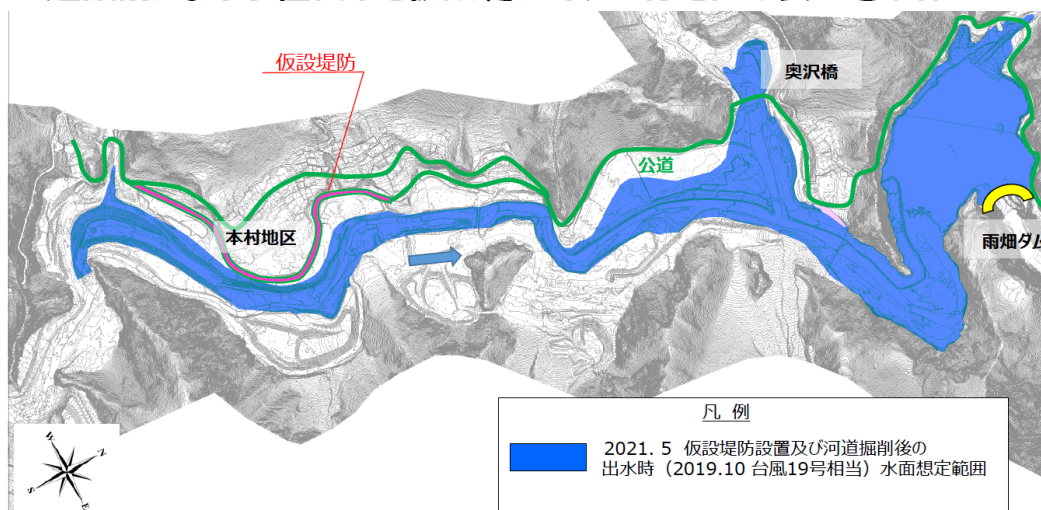


4

## 4. 雨畑川運搬路



NIPPON LIGHT METAL COMPANY, LTD.

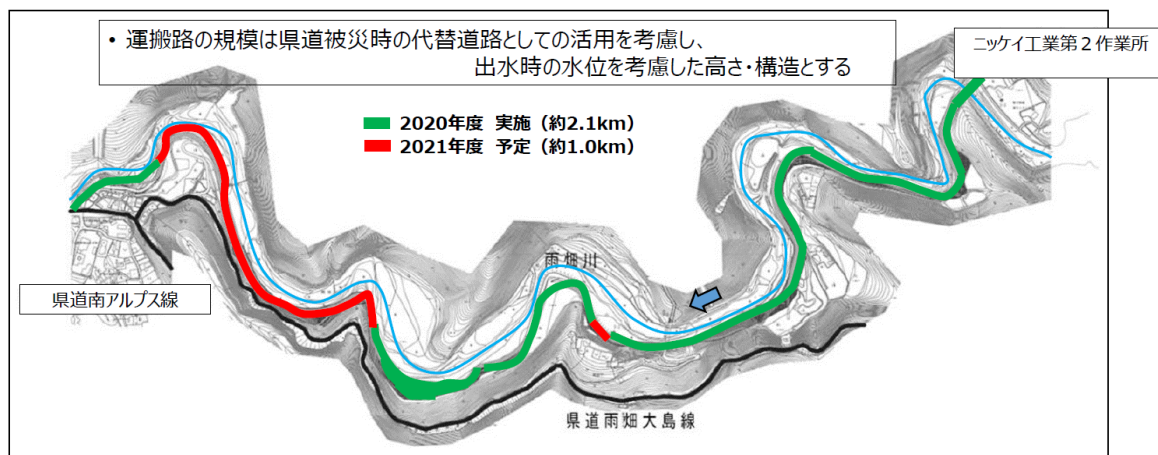

5

## 5. ダンプ運搬における地域対応



NIPPON LIGHT METAL COMPANY, LTD.

### 第2回 早川町内における土砂運搬対策推進協議会

#### 《目的》

早川町内の県道、早川河川内運搬道路等を使用する土砂運搬について、  
各事業の推進を図りながら町民の日常生活や一般交通への影響を軽減するための  
ルールの設定・運用、適切な道路の維持管理に関する協議を通じて、  
町民等の安心・安全を確保することを目的とする。

#### 《参加者》

国、県、町、ダンプ運搬関係事業者

#### 《第2回協議・報告内容抜粋 [2021年1月15日開催]》

- ・これまでの土砂運搬の検証について（運搬実績、運搬に係る対策の実施状況）
- ・今後の土砂運搬計画と実施する対策について（土砂搬出計画、運搬路整備計画）
- ・今後の土砂運搬の進め方について（早川町内県道37号線における土砂運搬台数計画）

6
